

中主小学校保護者の皆様

野洲市教育委員会  
教育長 西村 健

工事のスケジュールについて(お知らせ)

日ごろは、学校運営にご理解ご協力いただき、誠にありがとうございます。  
土壌汚染対策工事が9月7日に完了し現在は建物の柱や床を造る工事を行っています  
が、土壌汚染対策により工事に遅れが生じています。旧館棟改築工事後から始  
まる新館棟大規模改修工事と合わせてスケジュールを下記のとおり見直しましたの  
でお知らせします。

記


1. 工事スケジュール

Table with 4 columns for fiscal years (2021, 2022, 2023, 2024) and rows for construction projects (Old building renovation, New building renovation) and status (Current, Change). Includes Gantt-style bars for project durations.

- ※1 引越し時期を G W 期間に合わせています
※2 引越し時期を夏休み期間に合わせています
※3 新館棟改修工事完了後、仮設校舎を解体し令和6年10月頃の事業完了を予定

問い合わせ先 野洲市教育委員会事務局 教育総務課 監督員 大園 隆明
077-587-6014 (教育総務課直通)

# 中主小学校 全体配置図

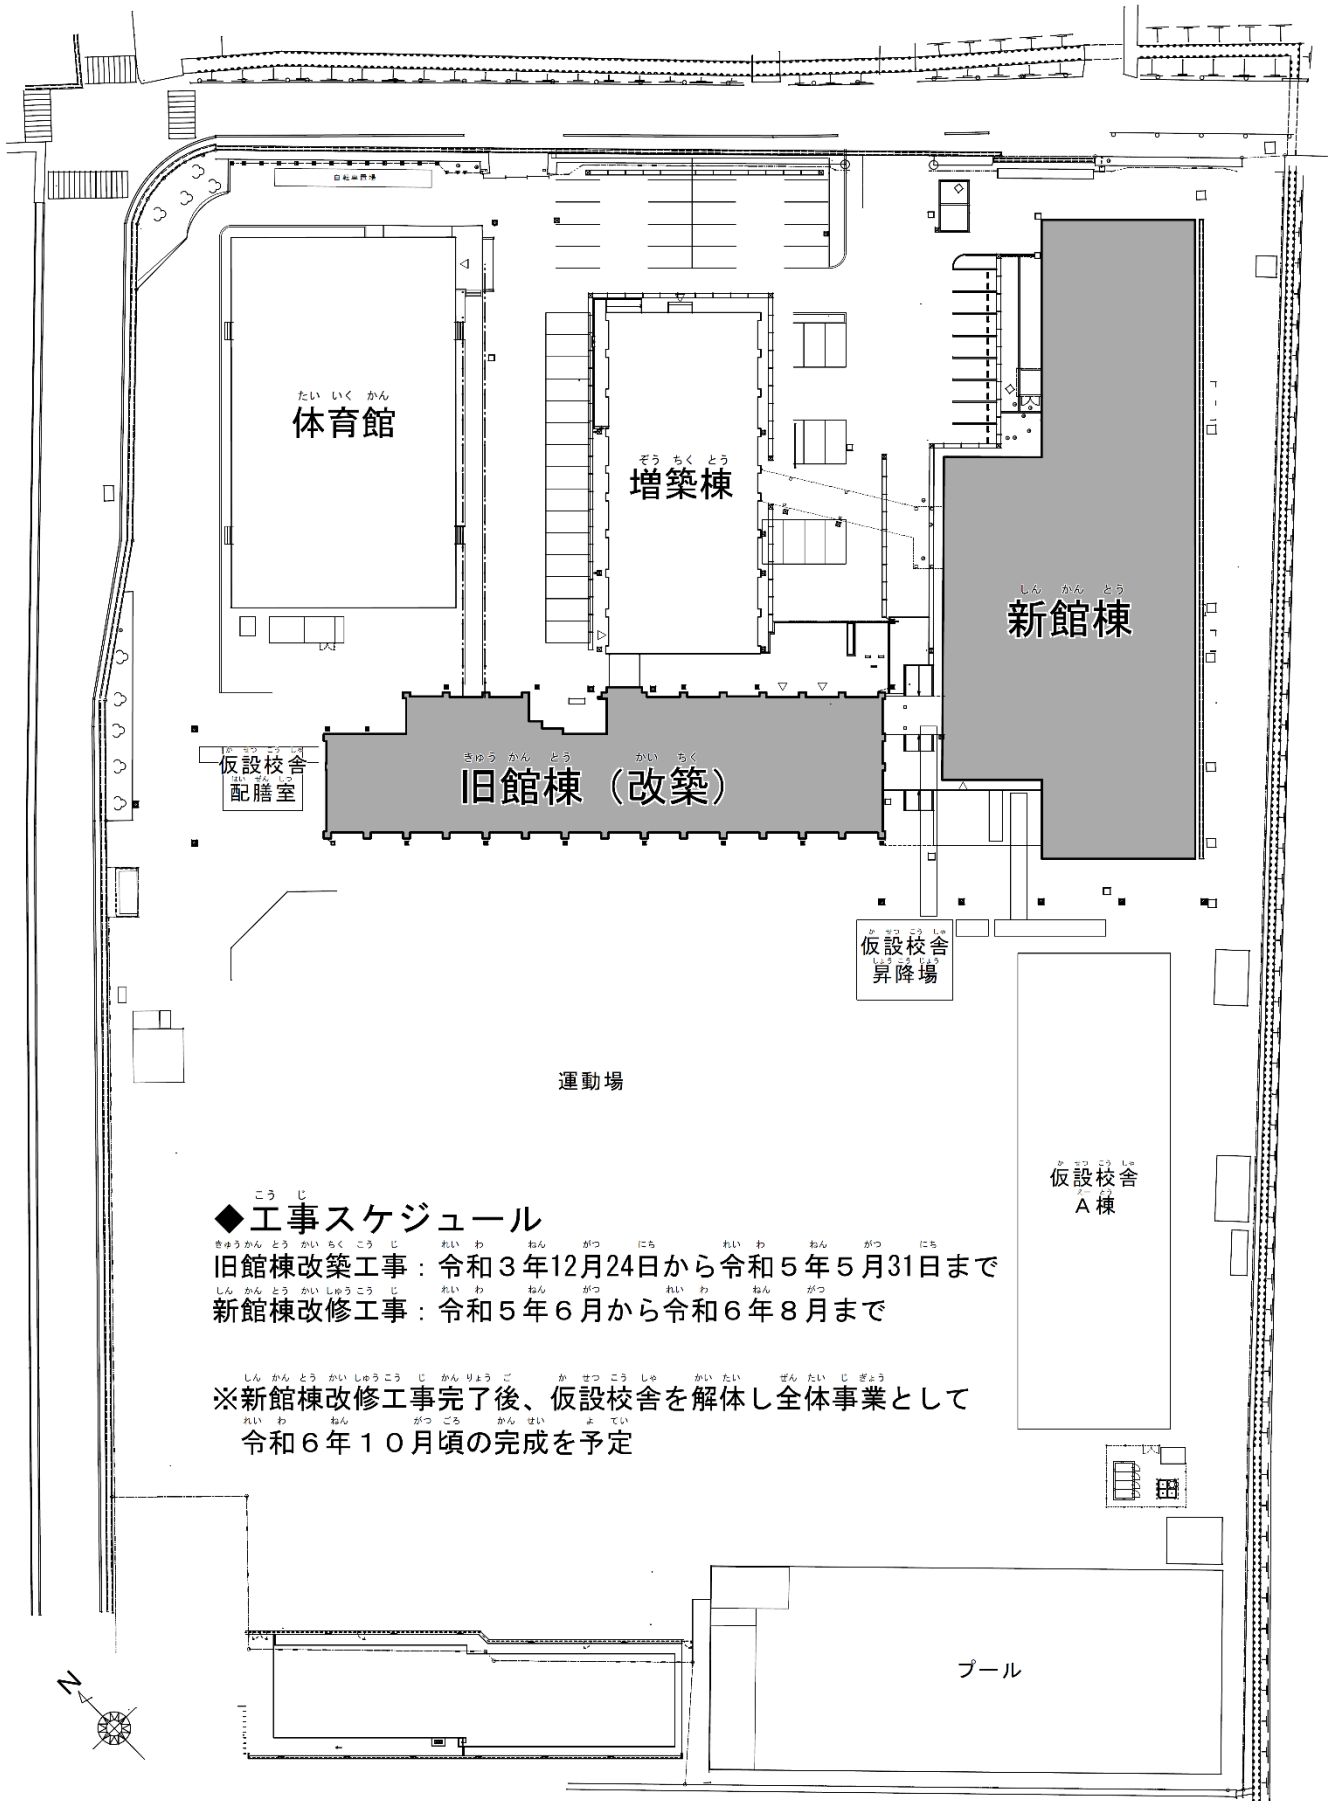

## ◆工事スケジュール

旧館棟改築工事：令和3年12月24日から令和5年5月31日まで

新館棟改修工事：令和5年6月から令和6年8月まで

※新館棟改修工事完了後、仮設校舎を解体し全体事業として  
令和6年10月頃の完成を予定
