

提供年月日	令和4年11月22日
担当部課	健康福祉部 発達支援センター
担当者	野崎
連絡先電話番号	077-587-0033

野洲市発達支援センター等新築工事の工期延長について

【概要】

新センターの新築工事については、建築主体工事請負契約を6月議会で可決いただき、電気設備、機械設備と共に工事を進めているところですが、建築の主体となる鉄骨部材の納期が遅れており最短で11月下旬に現地搬入となるとの報告を受けています。


鉄骨等の搬入時期を基に工事の工程を検討した結果、現工事期間である令和5年3月24日の工事完了は見込めないことが明らかとなり、下記のとおり3ヶ月から4ヶ月間の工期延長が必要と見込まれることから報告するものです。

なお、工期延長に伴う変更契約及び工事費予算の明許繰越については、令和5年2月議会に提案する予定です。

記

1. 工事名 令和4年度工第6号 野洲市発達支援センター等新築(建築主体)工事
受注者 株式会社 桑原組大津本店
常務執行役員本店長 齋藤 秋雄
請負代金 金422,400,000円(税込)
工期 当初 令和4年6月29日から令和5年3月24日
変更 令和4年6月29日から令和5年6月30日～7月31日
(3ヶ月から4ヶ月の延長)
2. 工事名 令和4年度工第8号 野洲市発達支援センター等新築(機械設備)工事
受注者 株式会社 山本管工
代表取締役 山本 真嗣
請負代金 金121,957,000円(税込)
工期 当初 令和4年6月17日から令和5年3月24日
変更 令和4年6月17日から令和5年6月30日～7月31日
(3ヶ月から4ヶ月の延長)
3. 工事名 令和4年度工第16号 野洲市発達支援センター等新築(電気設備)工事
受注者 株式会社 セイコーエレクトリック
代表取締役 井畑 忠
請負代金 金64,782,300円(税込)
工期 当初 令和4年7月13日から令和5年3月24日
変更 令和4年7月13日から令和5年6月30日～7月31日
(3ヶ月から4ヶ月の延長)

【位置図】

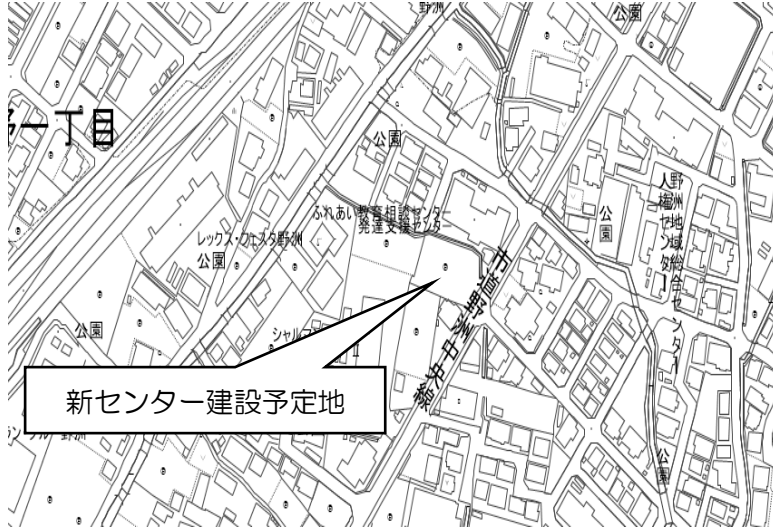

イメージ図

