





提供年月日	令和4年11月22日
担当部課	教育委員会 教育総務課
担当者	鎌田・大園
連絡先電話番号	077-587-6014 (3216)

中主小学校の改修事業のスケジュールについて

旧館棟改築工事は、土壌汚染対策工事が9月7日に完了し現在躯体工事（建物の柱や梁、床を造る工事）を行っています。土壌汚染対策により工事の進捗に遅れが生じています。改築工事後に施工する新館棟大規模改修工事と合わせてスケジュールを下記のとおり見直しましたのでお知らせします。

記

1. 工事スケジュール

		令和3年度(2021年)			令和4年度(2022年)			令和5年度(2023年)			令和6年度(2024年)					
		7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	
現時点	旧館棟改築工事				 令和3年12月24日から令和5年3月31日まで(※1)											
	新館棟大規模改修工事								 令和5年3月から令和6年1月まで							
変更	旧館棟改築工事				 ●土壌汚染対策 令和3年12月24日から令和5年5月31日まで									事業完了予定(※3)		
	新館棟大規模改修工事								 ●2月議会繰越 令和5年6月から令和6年8月まで(※2)							

※1 令和5年1月31日までの工期を契約変更により令和5年3月31日まで延長済み

※2 引越し時期を考慮し、夏季休業期間に合わせた工程とします

※3 新館棟改修工事完了後、仮設校舎を解体し令和6年10月頃の事業完了を予定

2. 予算事務手続きの予定


(1) 11月補正予算

- ①新館棟大規模改修工事関係の減額。新年度予算で改めて予算計上
- ②旧館棟改築工事備品整備事業の繰越手続き

(2) 2月補正予算

- ①旧館棟改築工事関係の繰越手続き

中主小学校 全体配置図

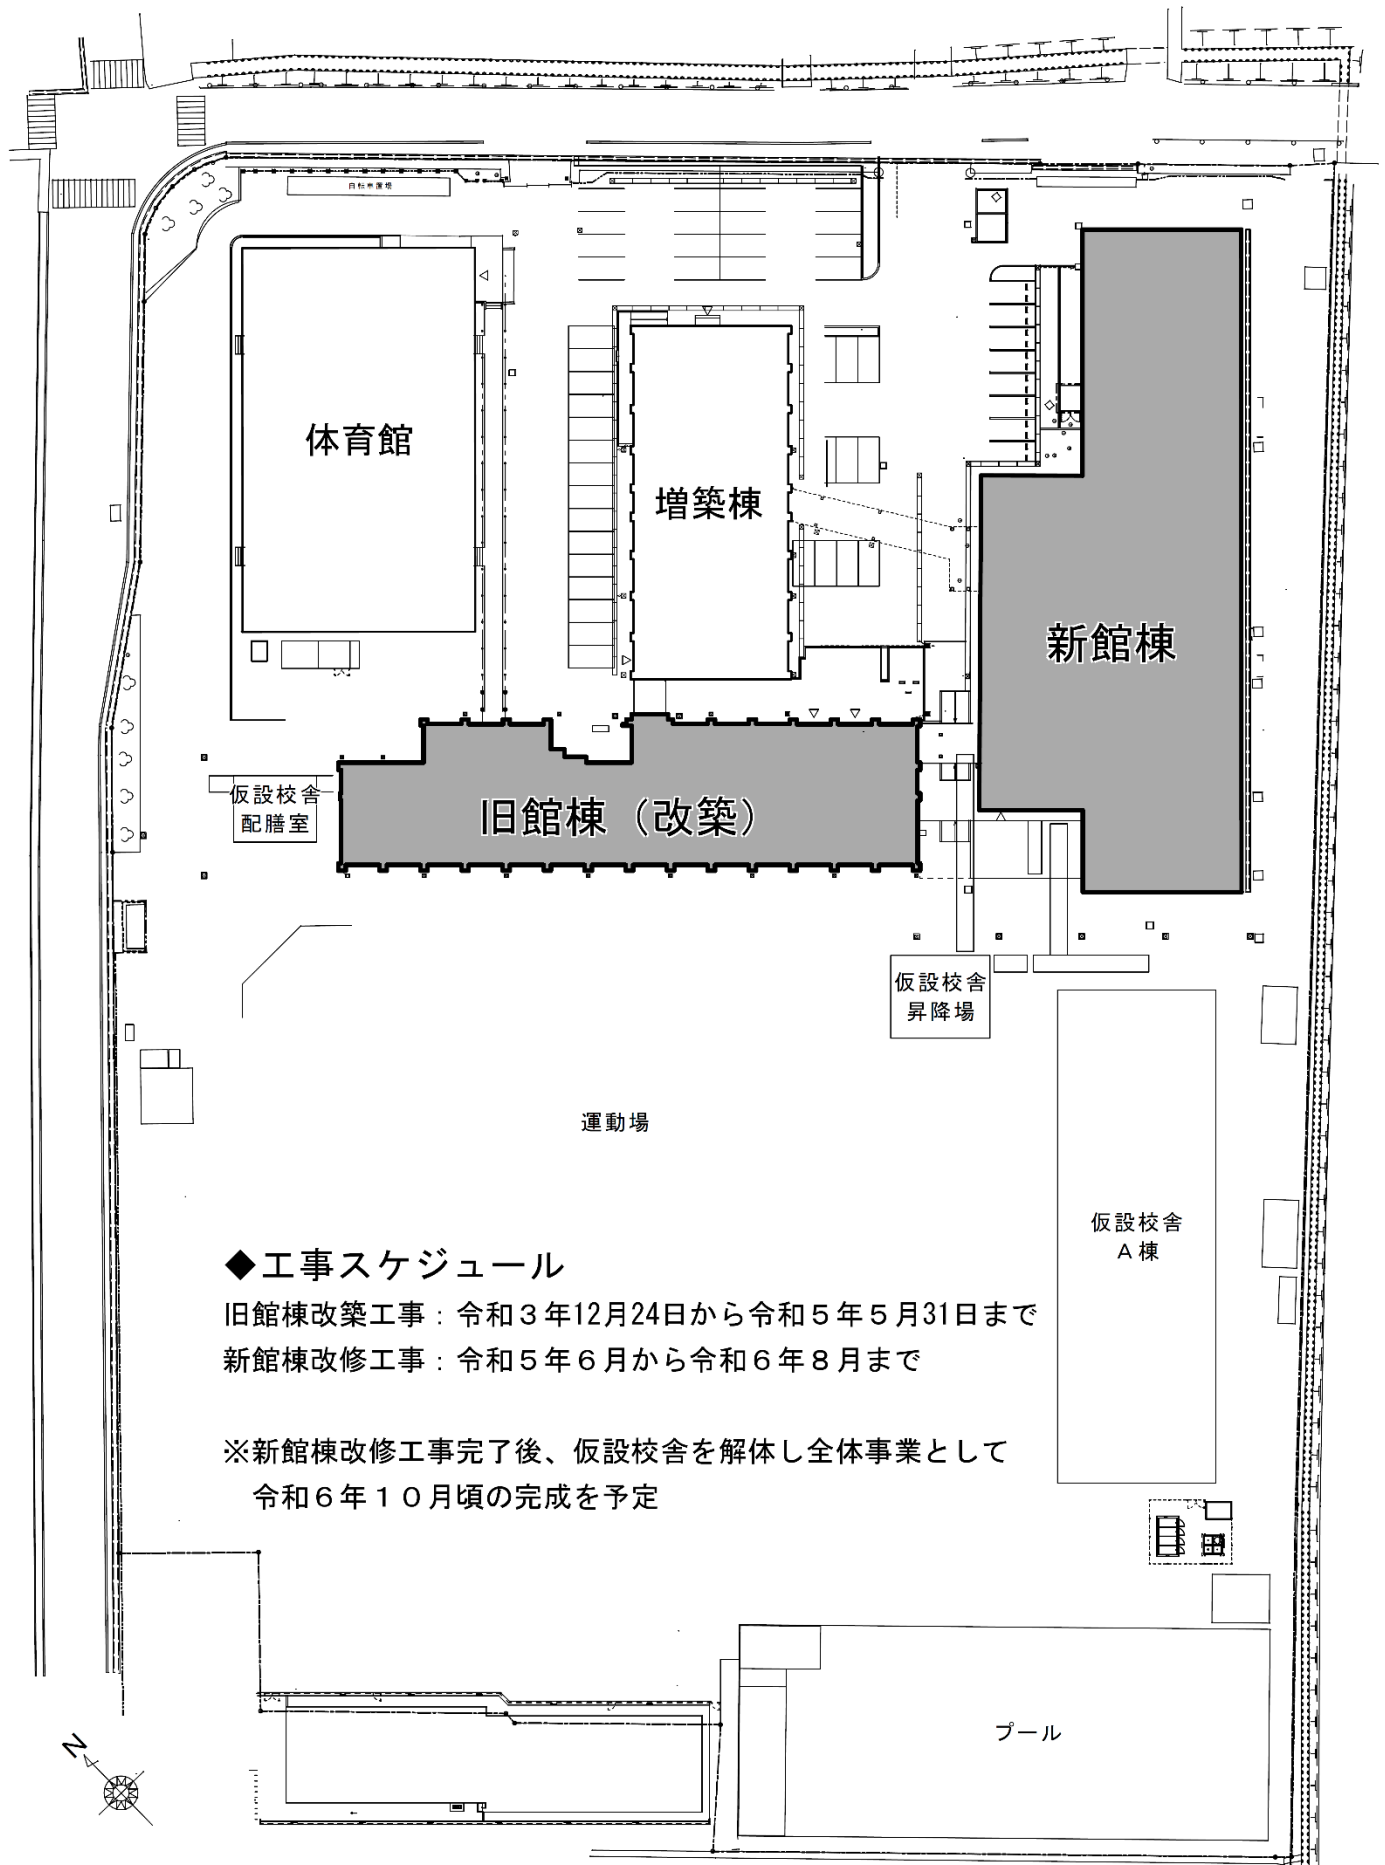

◆工事スケジュール

旧館棟改築工事：令和3年12月24日から令和5年5月31日まで

新館棟改修工事：令和5年6月から令和6年8月まで

※新館棟改修工事完了後、仮設校舎を解体し全体事業として
令和6年10月頃の完成を予定
