

2014年5月30日

(仮称)野洲市立病院整備基本計画策定について
＜都市基盤整備特別委員会資料＞

野洲市政策調整部
企画調整課地域戦略室
(587-6141)

これまでの流れ

○平成23年4月

野洲病院（民間病院）が市に『新病院基本構想2010』を提案
《市が土地建物と高額医療機器を調達し、野洲病院に貸付》

○平成23年5月/10月

本市の地域医療における中核的医療機関のあり方の検討 「⇒ 必要」

○平成24年1月/7月

新病院整備可能性の検討 「⇒ 可能性あり」

○平成24年12月

『野洲市中核的医療拠点のあり方に関する基本方針(素案)』の承認

○平成25年9月

病院整備に必要な基本構想策定にかかる予算が賛成多数で可決


○平成25年11月

（仮称）野洲市立病院整備基本構想の検討


○平成26年3月

（仮称）野洲市立病院整備基本構想を策定

市立病院開院までの流れ

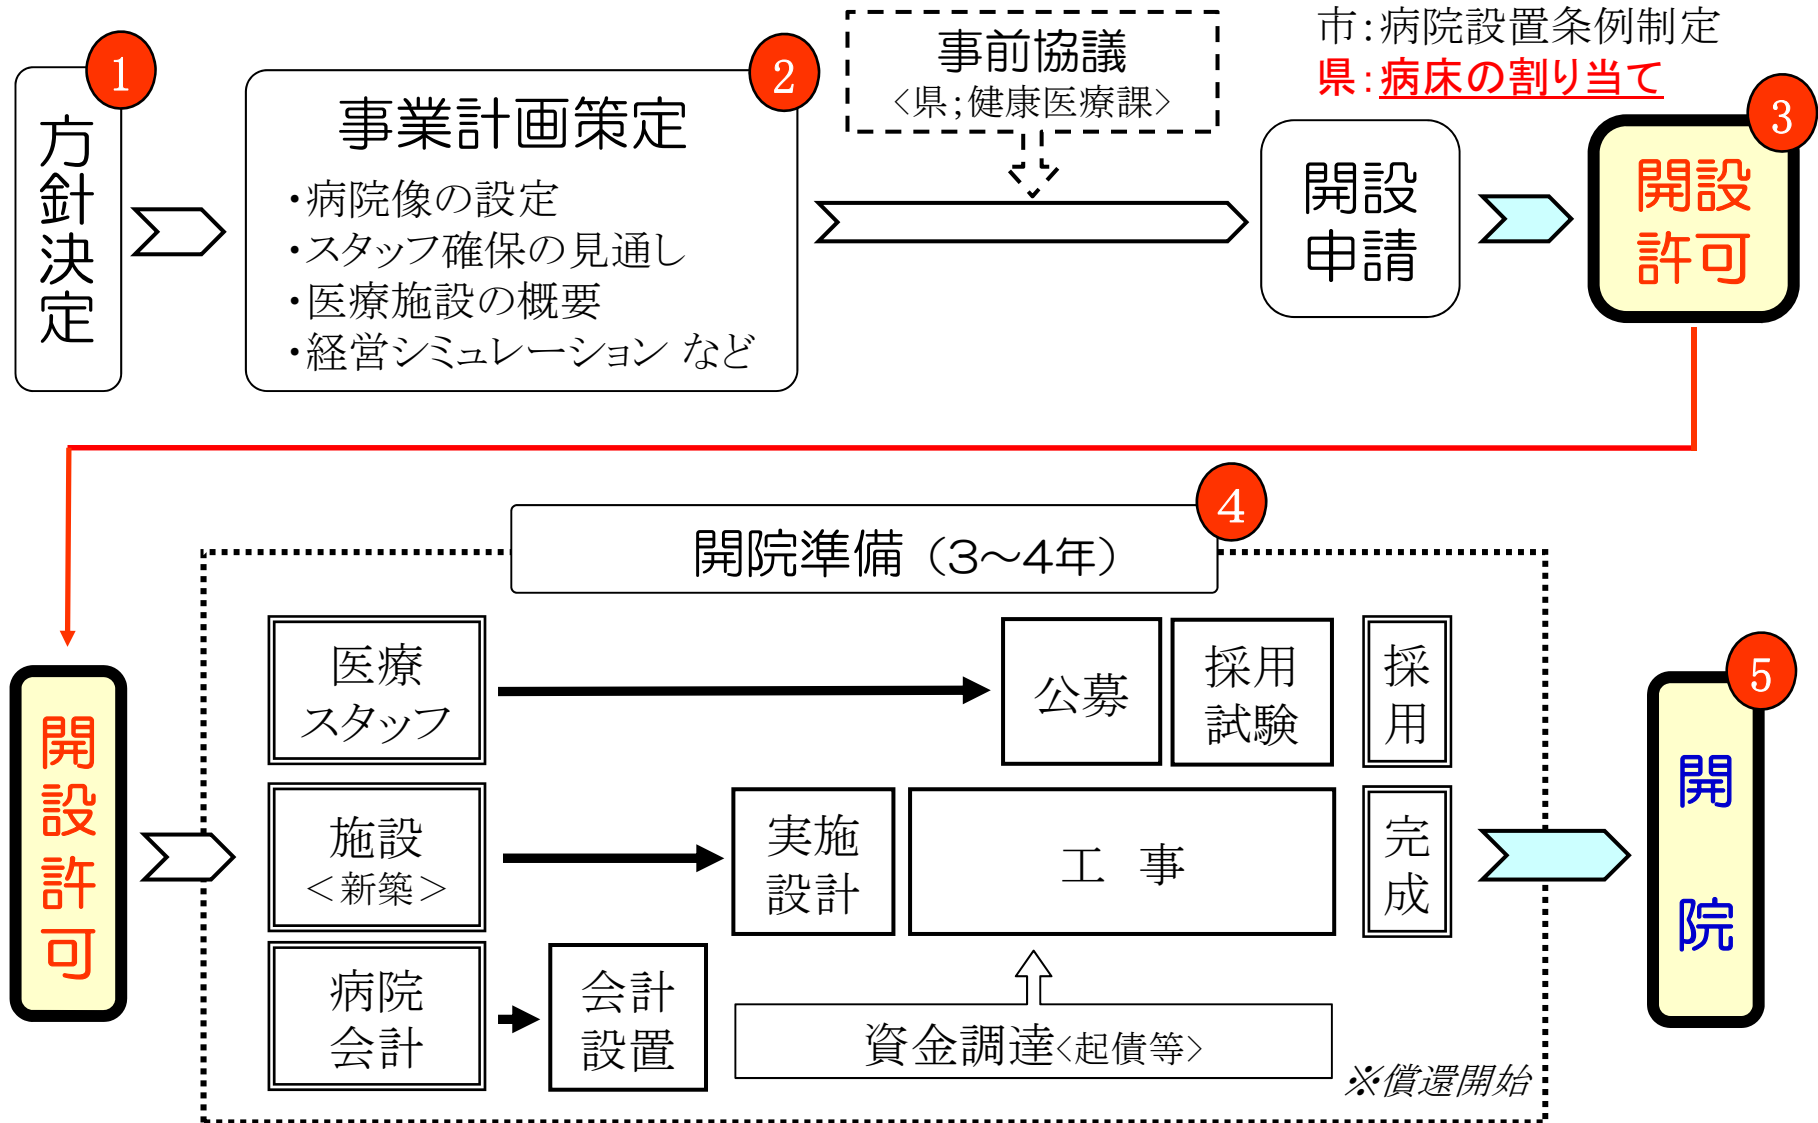

●開設申請手続き

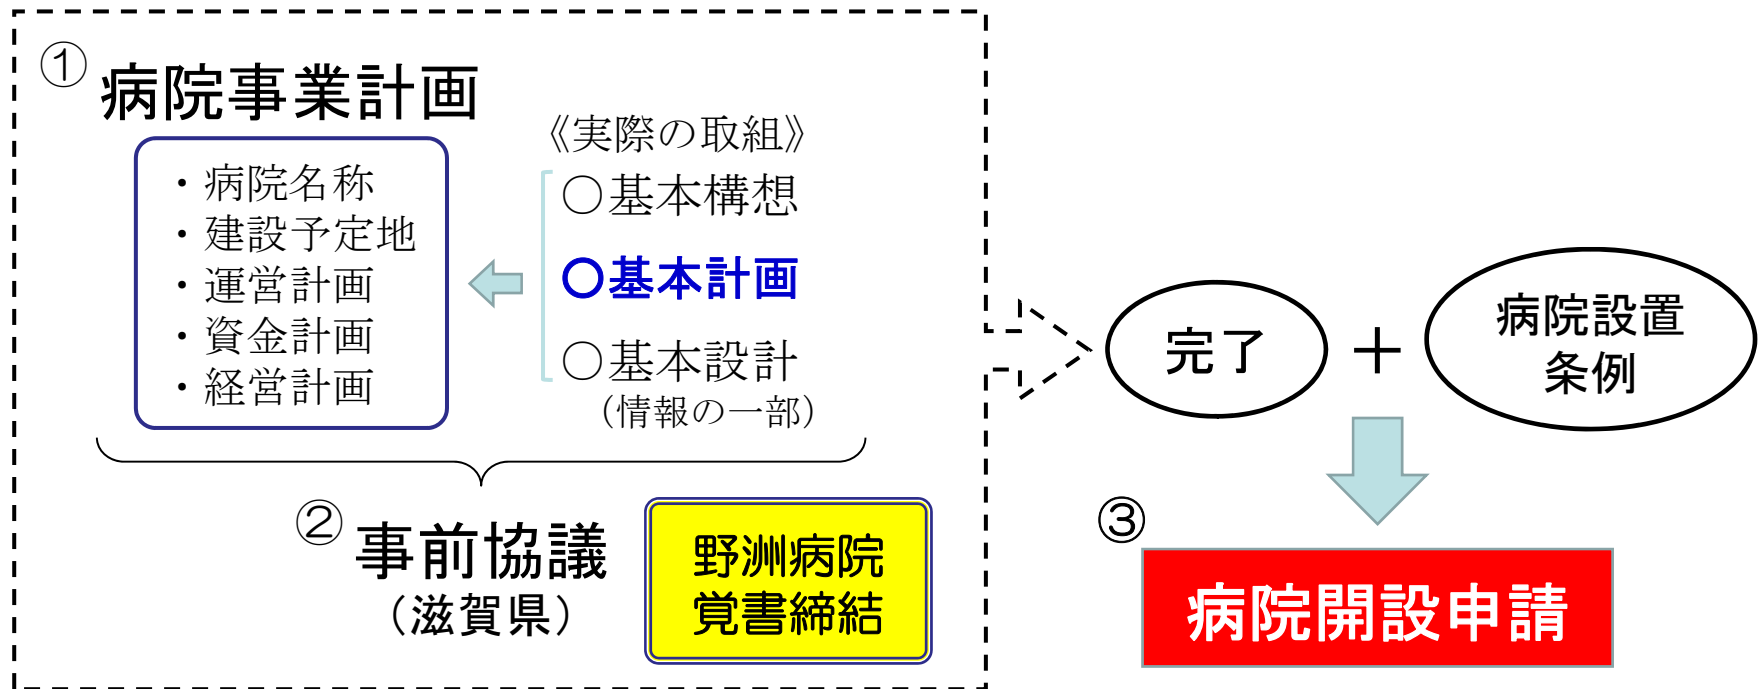

- ① 病院事業計画策定 <病院名称、建設予定地、運営計画、資金計画、経営計画策定>
⇒ 病院整備基本構想、基本計画、施設の基本設計の策定により対応
- ② 事前協議 <病院事業計画について県と協議>
⇒ 病院事業計画策定と同時進行で対応
【関連業務】
※ 野洲病院と覚書の締結 <市立病院開院と野洲病院閉院の整合(条件整理)>
- ③ 開設申請 <県との事前協議を経て、病院設置条例を制定し申請>
⇒ 事前協議完了後に取り組み

基本計画について


●基本計画の主な項目

- ① **基本方針、理念など**
 - ・基本構想の検証と確認、病院名称に関する考え方などの整理
- ② **全体計画**
 - ・基本構想と基礎調査結果などを反映し、病院像の再確認〈再設定〉
- ③ **部門別計画**
 - ・外来、入院、手術、薬剤など約20種の計画策定
 - ・各部門別の基本方針、機能、設計と条件などの整理
- ④ **医療機器、情報システム整備計画など**
 - ・医療機器整備、情報システム整備、物品物流管理、業務委託計画などの策定
 - ・基本方針、主要機器や導入範囲などの基本的な考え方の整理
- ⑤ **人員体制整備計画**
 - ・必要な職種、職員数の把握と採用(確保)の見込み、給与設定などの整理
- ⑥ **施設整備計画**
 - ・各部門別計画の設計と条件を踏まえた施設整備に関する考え方を整理
 - ・施設整備の概算費用、整備手法の検討、整備スケジュールなどの整理
- ⑦ **収支計画**
 - ・①～⑥の計画に基づく収支計画の策定
- ⑧ **資金計画**
 - ・市財政出資金、繰出し金などの実現可能額と課題整理など

●計画策定の手順

○ 素案(叩き台)の作成	事務局で作成	〈作業支援＝コンサル委託〉
○ 現場意見等の反映	意見聴取	〈医療現場、庁内調整など〉
○ 客観評価	委員会形式	〈専門家、市民代表など〉
○ 関係機関調整	事前協議	〈滋賀県；健康医療課、保健所など〉
○ 合意形成	議会、市民集会など	

《イメージ》

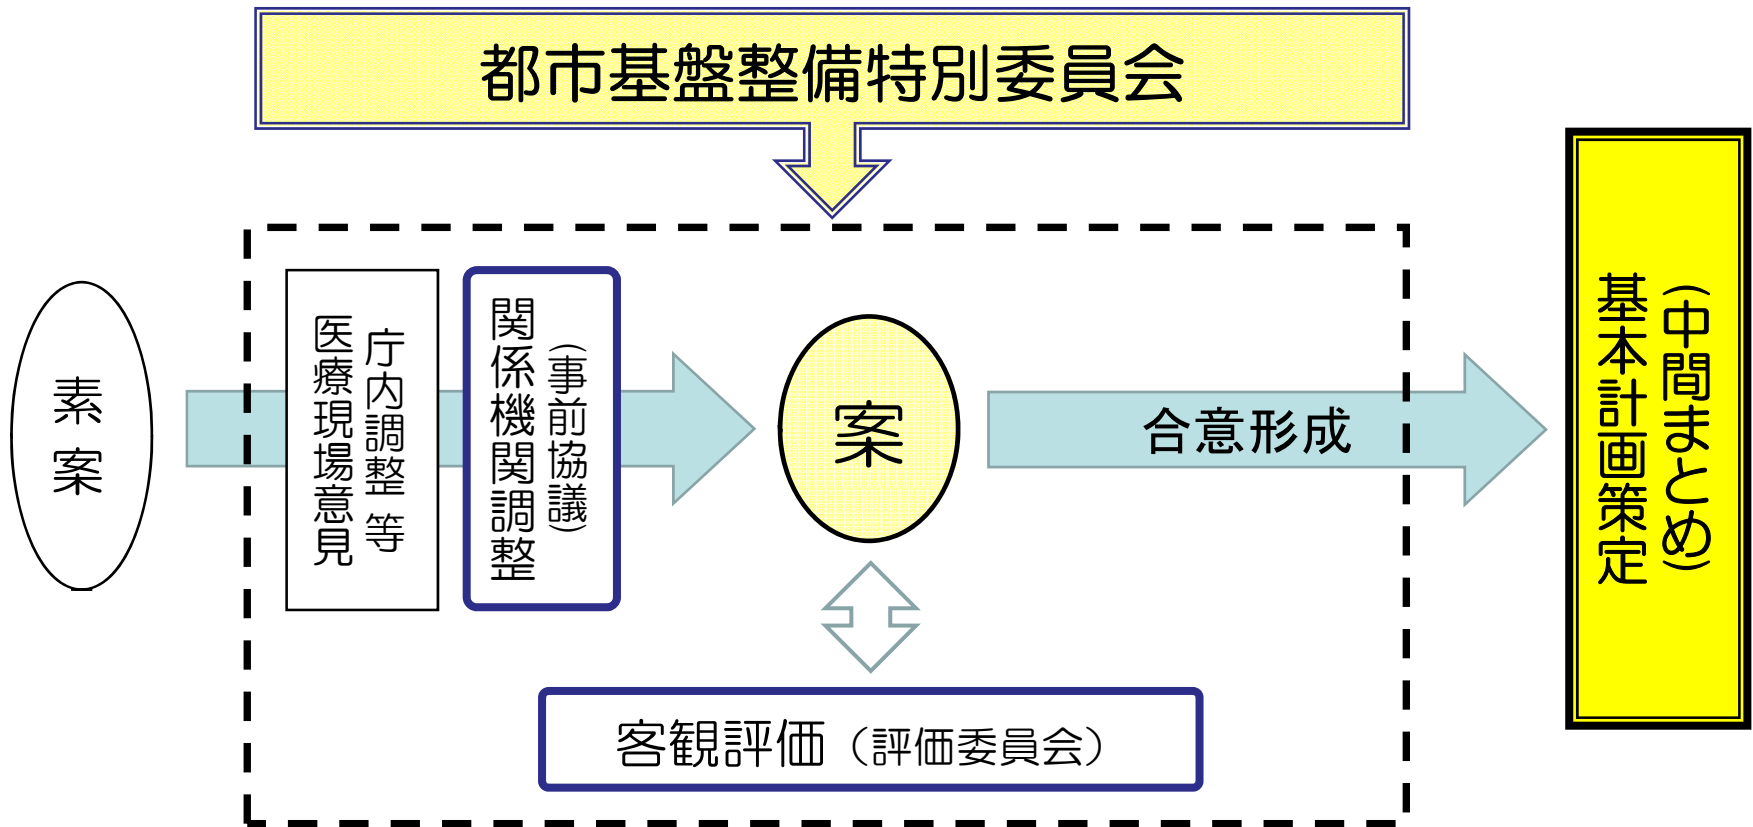

全体スケジュール

予定

年度	25	26				27				28	29	30	31		
	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	上	下	上	下	上	下
基本構想	→			中間まとめ					完成						
基本計画															
基本設計(施設)															
野洲病院調整 (覚書締結)															
事前協議 (滋賀県)															
設置条例															
開設申請/許可															
会計設置															
実施設計/工事															

◎基本計画策定スケジュール <中間まとめまで>

予定

	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
議会(特別委員会)	適宜開催									
評価委員会			○		○		○		○	
①基本方針、理念など <基礎調査>										
②全体計画										
③部門別計画										
④医療機器計画など										
⑤人員体制整備計画										
⑥施設整備計画										
⑦収支計画										
⑧資金計画										
